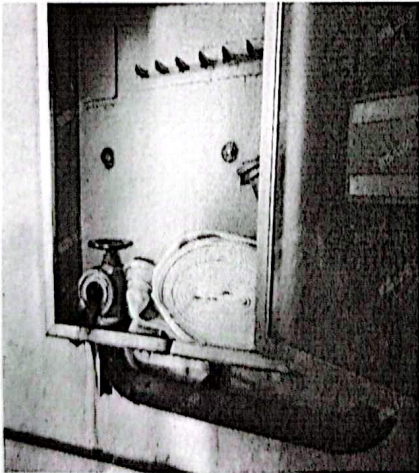


维工项目立项申请表

工程名称	西部焦油油库区域, 苯加氢油库区域及针状焦二期主管网消防水管道维修	工程编号	26 维化安-05
工程主要内容	1. 西部焦油地下消防水管道 2025 年更换尾气南侧泄露的 DN150 消防水管道, 地下消防水管网增加区域阀门, 2026 年计划对中间油库及配油沥青油库西侧环线 DN250 管道继续进行维修处理, 更换消防水管道阀门, 降低消防水泄漏量, 保障消防管网压力。 2. 苯加氢 2025 年低压消防水更换新水泵房稳压泵出口至装置区东墙外 $\phi 377$ 管道和装置区内东侧、南侧和西侧 $\phi 273$ 管道, 2026 年准备对装置区整个北侧和油库的东侧、西侧低压消防水管道没有更换。 3. 针状焦二期 2025 年更换酚精制泵房、库房室内消防水管道及墙壁消防栓、消防箱; ; 2026 年准备更换针状焦二期地下消防水主管网管道; 去中试基地、喹啉、酚精制地下消防水分管道; 喹啉泵房、库房、中试基地室内消防水管道及消防栓阀门。		
立项原因	1、立项原因及必要性 1. 西部焦油作业区低压消防水系统目前存在泄漏, 经反复维修后漏点仍无法消除且日常维修量大, 目前系统管网存在丢水, 同时导致存在消防管网压力无法保持的问题。 2. 苯加氢油库区一级重大危险源低压消防水管道存在多处漏点, 经反复维修后漏点仍无法消除且日常维修量大; 管道整体腐蚀变薄埋于地下存在隐形漏点无法发现, 不但造成消防水的浪费而且影响低压消防管网系统的稳定运行。 3. 针状焦二期消防水系统目前存在泄漏, 经反复维修后漏点仍无法消除且日常维修量大, 目前系统管网存在丢水, 导致系统水压减小, 供应不足, 需要跟换维修。 2、目前缺陷情况照片  		

朱磊
刘. 洛. R.

刘. 洛. R.
2024

陈. 洛. R.
2024

